


PORTAFOLIO BIM & AUTOMATIZACIÓN AEC

Gestión de datos, estandarización de procesos y desarrollo de herramientas digitales para conectar la oficina técnica con la ejecución en obra.

KAREN FIGUEROA AYÓN

BIM MANAGER & AEC DATA SPECIALIST · GUAYAQUIL, ECUADOR

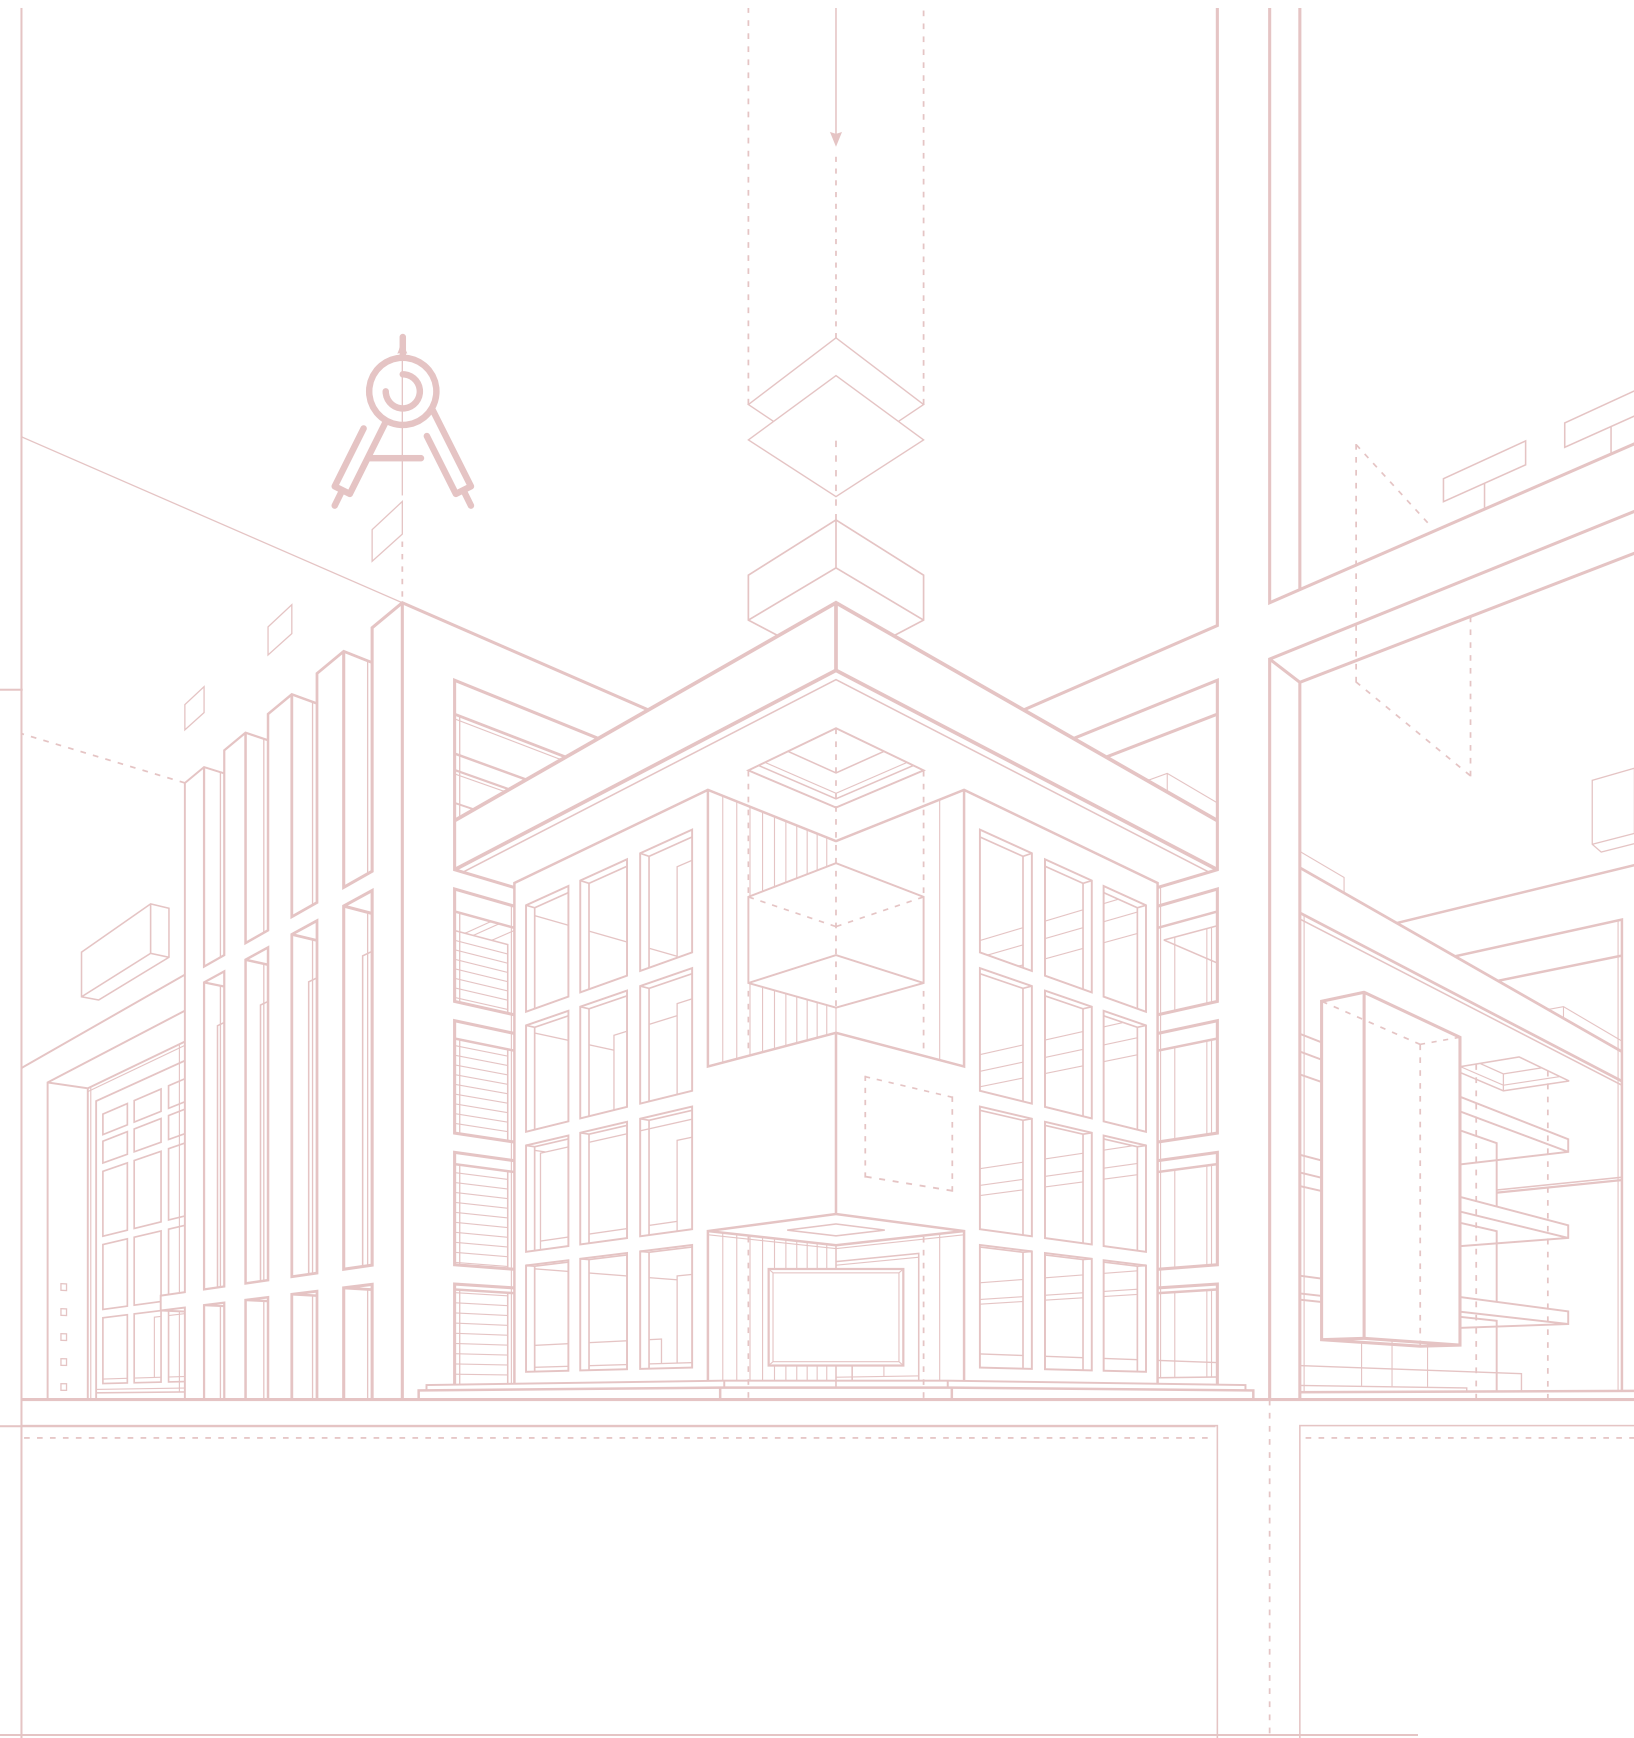


SOBRE MÍ



KAREN FIGUEROA

Celular: + 593 989 147 209
Correo: jamifi.me@gmail.com
Ubicación: Guayaquil | Ecuador
LinkedIn: /in/karen-figueroa-bim



PERFIL PROFESIONAL

Arquitecta y BIM Manager especializada en la gestión integral de proyectos, gobernanza de datos y optimización de flujos colaborativos en la industria AEC. Mi enfoque combina la precisión de la coordinación interdisciplinaria con la creación de herramientas digitales personalizadas (Apps Script, IA) para conectar la oficina técnica con la obra.

EDUCACIÓN

2017 - 2022 | ULEAM

Grado en arquitectura

2023 | Universidad Lux

Diseño de Interiores (280h)

EXPERIENCIA

2026 - Pres. | Grupo Concrētus

BIM Manager & Gestión Digital

2024 - 2026 | Grupo Concrētus

Líder de Proyectos BIM

2023 - 2024 | Grupo Concrētus

Asistente de Arquitectura BIM

COMPETENCIAS

- *Gobernanza BIM, ISO 19650 & CDE (WIP/Shared/Published)*
- *Automatización con IA (VS Code) & Google Apps Script*
- *Revit (LOD 400), ACC, Revizto, Navisworks*

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- *Gestión de Proyectos en MS Project*
- *Modelado 3D & Renderizado (SketchUp + V-Ray)*

CONTENIDO PORTAFOLIO TÉCNICO

01

Gobernanza & Estándares BIM

Protocolo corporativo de nomenclatura, estructura de CDE y matrices de organización de información.

02

Business Intelligence & Web Apps

BIM Hub v3.0, control de avance de anexos 5D y seguimiento de RFIs e incidencias.

03


Automatización & IA (Revit API)

Scripts de auditoría en VS Code asistidos por IA para sanidad de modelos y parámetros .RVT.

04

Gestión Digital & CDE en Obra

Administración de ACC bajo ISO 19650, gestión de incidencias con Revizto y cultura de adopción BIM

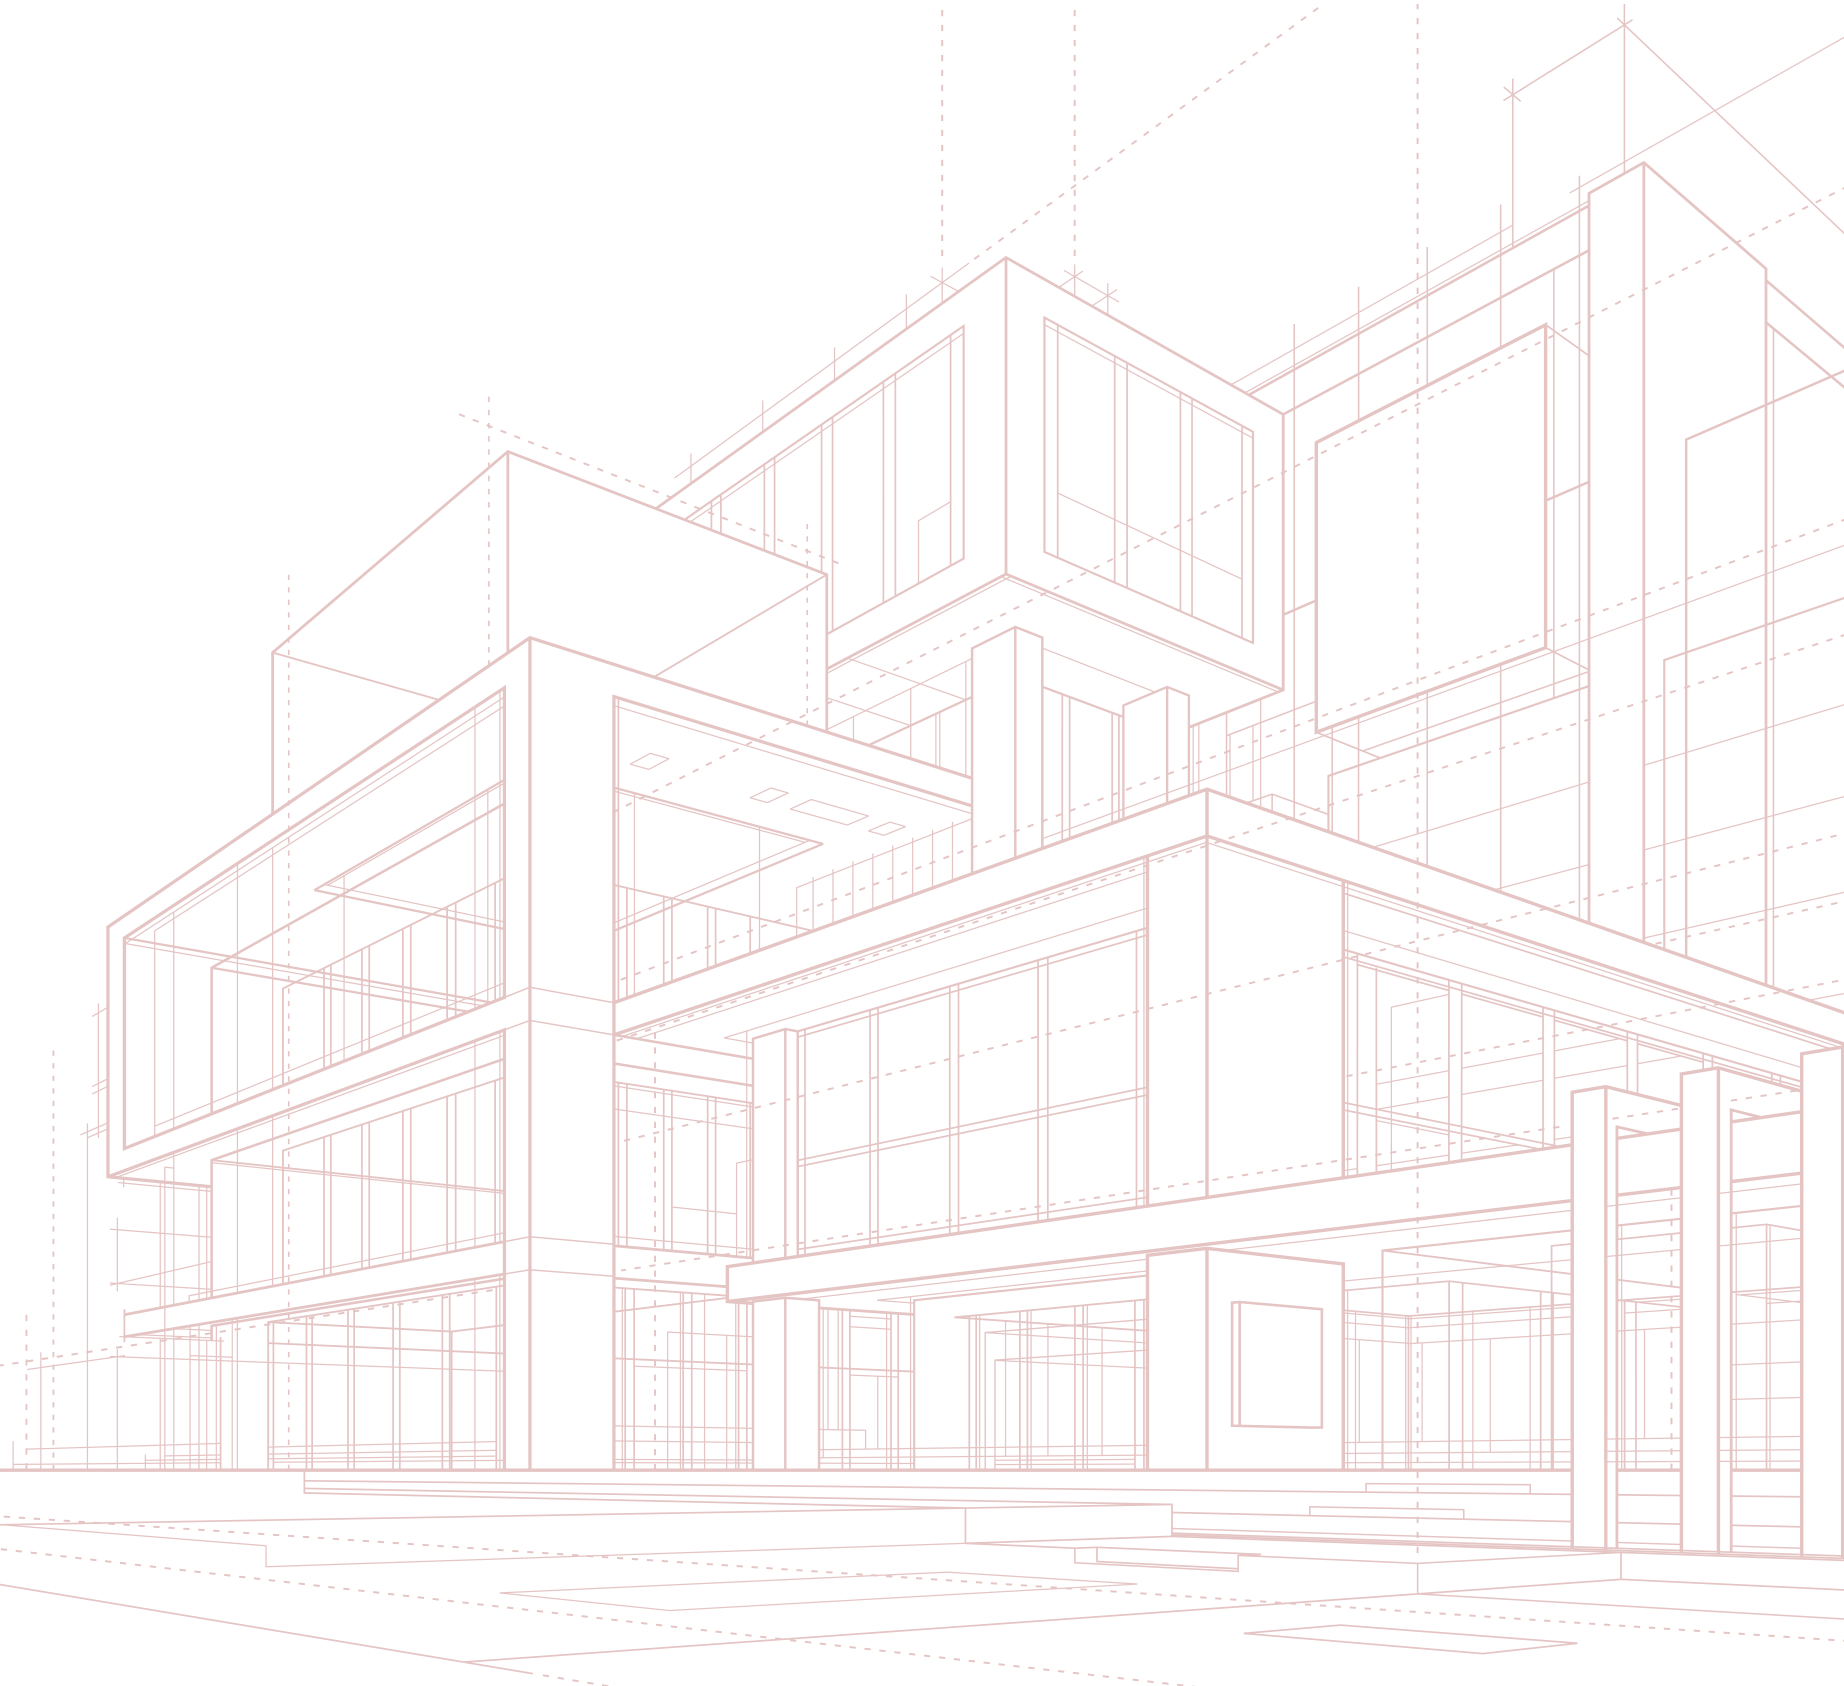

PILAR-01

Alcance:
Estandarización
Corporativa

Herramientas:
Revit / ACC / CDE

Entorno:
Grupo Concrētus (2026)

GOBERNANZA & PROTOCOLO BIM

Diseño e implementación del marco metodológico corporativo para la estandarización de nomenclaturas, organización de información en el Entorno Común de Datos (CDE) y estructuración de parámetros de control.

01





I Archivos

II Vistas & Planos

III Tablas de Rubros 5D

IV Familias Paramétricas

V Flujo CDE
(WIP/Shared/Pub)



01

EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

PROTOCOLOS & ESTÁNDARES DE NOMENCLATURA

REGLAS DE CODIFICACIÓN & DISCIPLINAS

- Estandarización Estricta: Uso exclusivo de MAYÚSCULAS y guiones bajos (_) como único separador. Prohibidos espacios, tildes y caracteres especiales.
- Matriz de Disciplinas: Codificación unificada de 12 especialidades (ARQ, EST, ELE, ELP, HVAC, AAPP, AASS, AALL, SCI, RIE, PRE, COOR).
- Control de Versiones en ACC: Eliminación absoluta de sufijos manuales (v2, FINAL, copia). La trazabilidad se gestiona directamente en la nube.

CONSIDERACIONES GENERALES

NAVEGADOR DE VISTAS

PARÁMETROS DE AGRUPACIÓN

GC_ORGANIZADOR_VST

+

Familia y tipo

NOTA

El parámetro GC_ORGANIZADOR_VST debe aplicarse únicamente a la categoría de vistas y debe ser llenado con las siguientes variables

DISC_PLANOS OFICIALES

Agrupar todas las vistas que corresponden a los planos de cada disciplina, estas vistas no se tocan.

WRK_INTERNO

Agrupar las vistas que se utilizan por el modelador para realizar cambios o ajustes en el diseño.

EXP_EXPORTAR

Agrupar las vistas que se usan para compartir con obra por ejemplo REVIZTO, estas vistas no se tocan.

ANEX_EV_# o ANEX_PL_#

Agrupar las vistas usadas para los anexo y deben clasificarse según el # de planilla o evaluación.

EJEMPLOS CORRECTOS E INCORRECTOS

ARCHIVO

VISTAS

TABLAS

PLANOS (DWG/PDF)

• PROY-ABREV-ARQ-MODELO 3D.rvt

• ARQ_N02_TUMBADO GYPSUM

• CMAT_CUANTIFICACION DE ACABADOS

• PROY-ABREV-ARQ-PLANTA ARQUITECTONICA N01.dwg

✗ proy abrevl_arq modelo3d.rvt

✗ arq n2do gypsum

✗ Cmat Cuantificacion Acabados

✗ planta final arquitectura 01.dwg

NAVEGADOR DE PLANOS

PARÁMETRO DE AGRUPACIÓN

GC_ORGANIZADOR_PLAN

NOTA

El parámetro GC_ORGANIZADOR_PLAN debe aplicarse únicamente a la categoría de planos. Además cada plano debe estar dentro de un conjunto de planos.

CONJUNTOS DE PLANOS

PLANOS OFICIALES

Agrupar los planos de cada disciplina.

ANEX_EV_# o ANEX_PL_#

Agrupar los anexo y deben clasificarse según el # de planilla o evaluación.

NAVEGADOR DE TABLAS

PARÁMETRO DE AGRUPACIÓN

GC_ORGANIZADOR_TAB

NOTA

El parámetro GC_ORGANIZADOR_TAB debe aplicarse únicamente a la categoría de tablas.

WRK_INTERNO

Tablas que sean usadas por el modelador para revisar elementos en el modelo.

COOR_OBRA

Tablas usadas por el coordinador de obra para hacer seguimientos o reportes.

ANEX_EV_# o ANEX_PL_#

Tablas usadas para los anexo y deben clasificarse según el # de planilla o evaluación.

ERRORES COMUNES

✗ Usar minúsculas o mezcla de mayúsculas.

✗ Incluir espacios, tildes, ñ o caracteres especiales.

✗ No usar el guion como separador.

✗ Nombres diferentes para el mismo archivo en distintas entregas.

✗ Usar sufijos como _v2, _FINAL, _copia.

e

PILAR-02

Alcance:

Control Operativo & BI

Herramientas:


Google Apps Script / ACC /
Google Sheets

Plataformas (Desarrollo propio):

- BIM Hub v3.0
- Registro de RFI's
- Control de anexos

BUSINESS INTELLIGENCE & WEB APPS

Desarrollo de la plataforma web corporativa BIM Hub v3.0 mediante Google Apps Script para automatizar la consolidación de datos, el seguimiento de RFI's e incidencias de obra y la trazabilidad de planillas de avance 5D en tiempo real

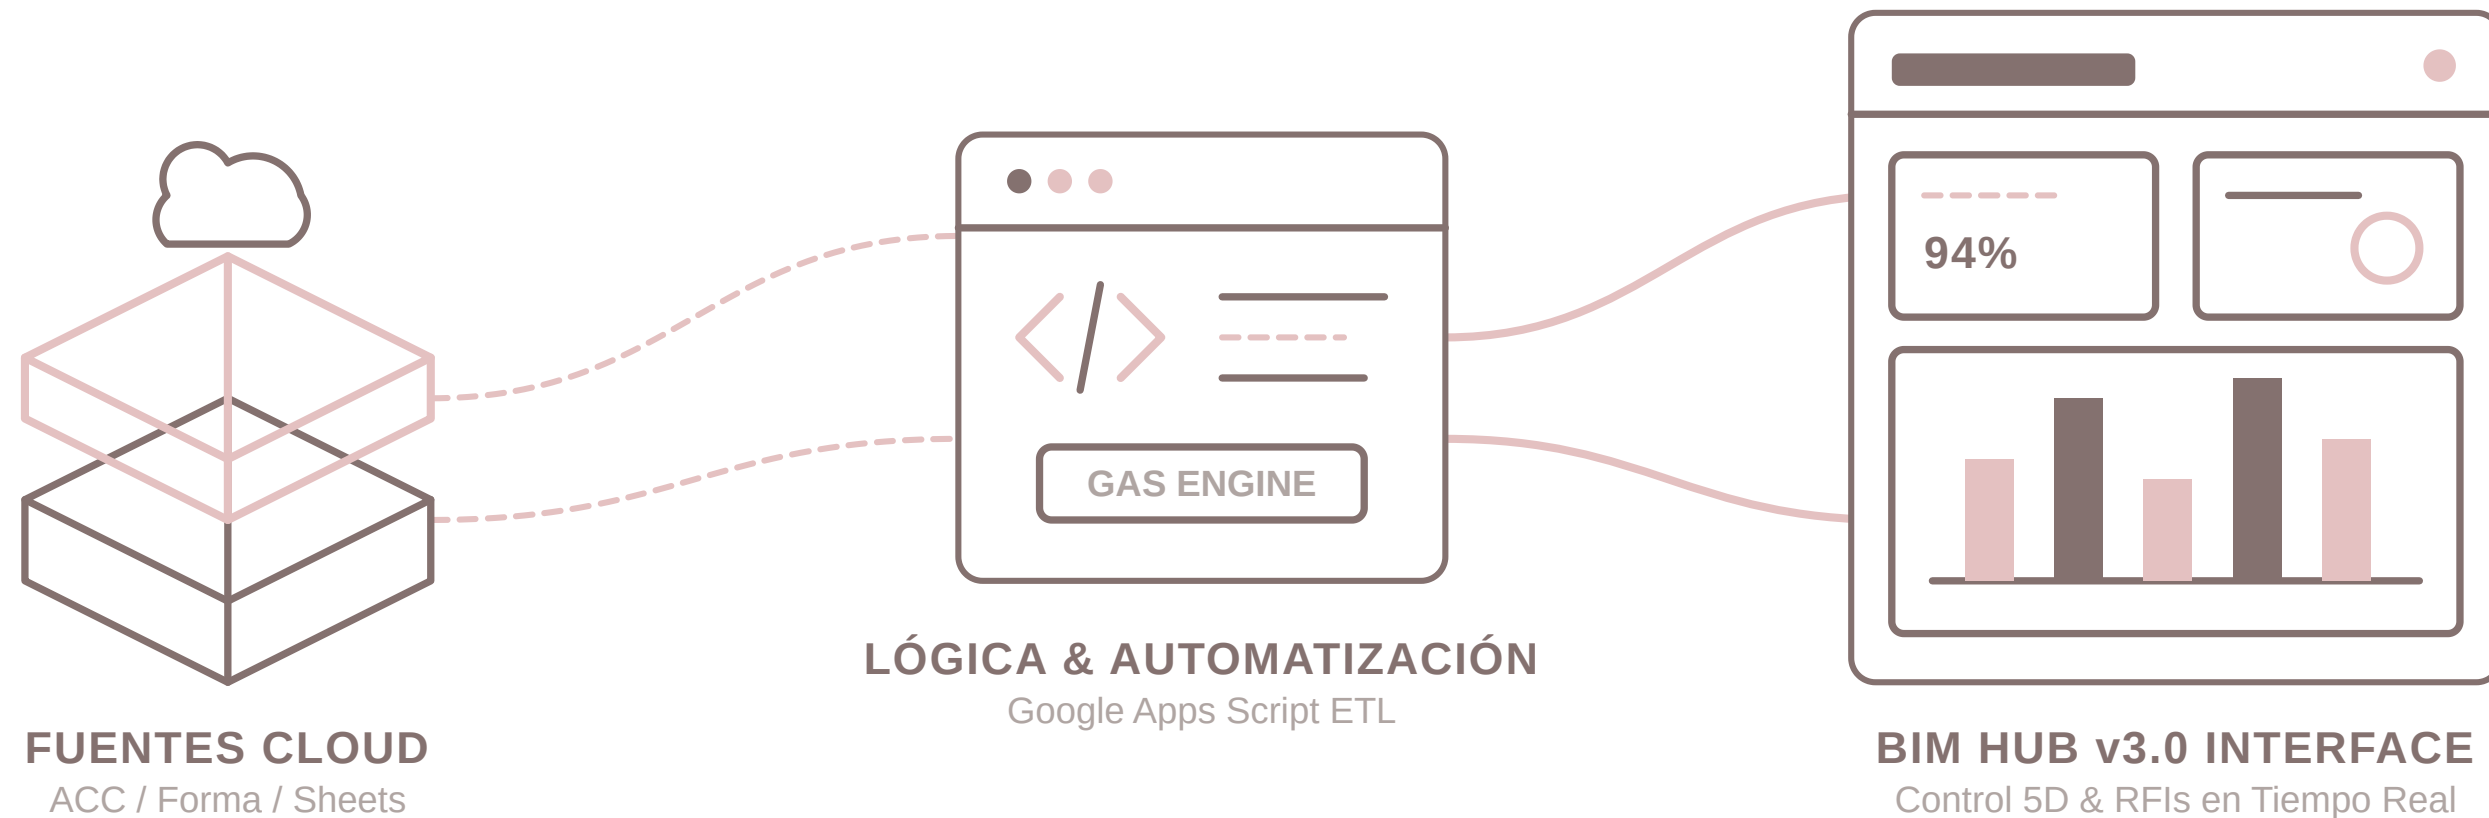

02

EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

BUSINESS INTELLIGENCE & WEB APPS (BIM HUB V3.0)

01. PLATAFORMA WEB CENTRALIZADA

Centralización de métricas de proyectos en tiempo real mediante HTML/CSS personalizado en Google Apps Script

CRÍTICOS	EN REVISIÓN	ACT. ACUM.	AVANCE
1	2	43 / 52	
2	17	23 / 31	
1	1	17 / 18	
0	0	11 / 17	
0	0	6 / 6	

Grupo Concretus

COORDINACIÓN BIM & ARQUITECTURA DIGITAL

Protocolo BIM - 2026

04-06

Resumen global

RFIs

Abiertos

52

En revisión

20

Críticos

4

Fuera de plazo

13

Actividades

Pendientes

18

En progreso

29

Completadas

175

Anexos

Total

848

Ejecutados

843

Pendientes

5

ACC / Forma

Archivos sync

595

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

PROYECTO	RFIS ABIERTOS	CRÍTICOS	EN REVISIÓN	ACT. ACUM.	AVANCE	ESTADO
Residencias En construcción	6	1	2	43 / 52	83%	
Front En construcción	36	2	17	23 / 31	74%	
Parque Lineal En construcción	10	1	1	17 / 18	94%	
Camal Daule En construcción	0	0	0	11 / 17	65%	
Relleno Daule En construcción	0	0	0	6 / 6	100%	

Conectado - Apps Script + Google Sheets

Grupo Concretus

02. RFI & ISSUE TRACKER


Control de trazabilidad de requerimientos de información de obra, reduciendo tiempos de respuesta e integrando estados de resolución

Disciplina	Urgencia	Fecha límite	Fecha respuesta	Días
ESTRUCTURA	Medio	06/04/2026	06/04/2026	4
ARQUITECTURA	Medio	06/04/2026	03/04/2026	3
HIDROSANITARIO	Medio	13/04/2026	13/04/2026	6
ESTRUCTURA	Alto	07/04/2026	17/04/2026	10
ARQUITECTURA	Bajo	09/04/2026	08/04/2026	1
ARQUITECTURA	Bajo	10/04/2026	10/04/2026	2
ESTRUCTURA	Bajo	17/04/2026	—	—
ARQUITECTURA	Medio	20/04/2026	20/04/2026	2
ARQUITECTURA	Crítico	22/04/2026	21/04/2026	1
ARQUITECTURA	Crítico	22/04/2026	21/04/2026	1
ARQUITECTURA	Crítico	22/04/2026	22/04/2026	1
HIDROSANITARIO	Crítico	23/04/2026	22/04/2026	1

02

EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

BUSINESS INTELLIGENCE & WEB APPS (RFI'S)

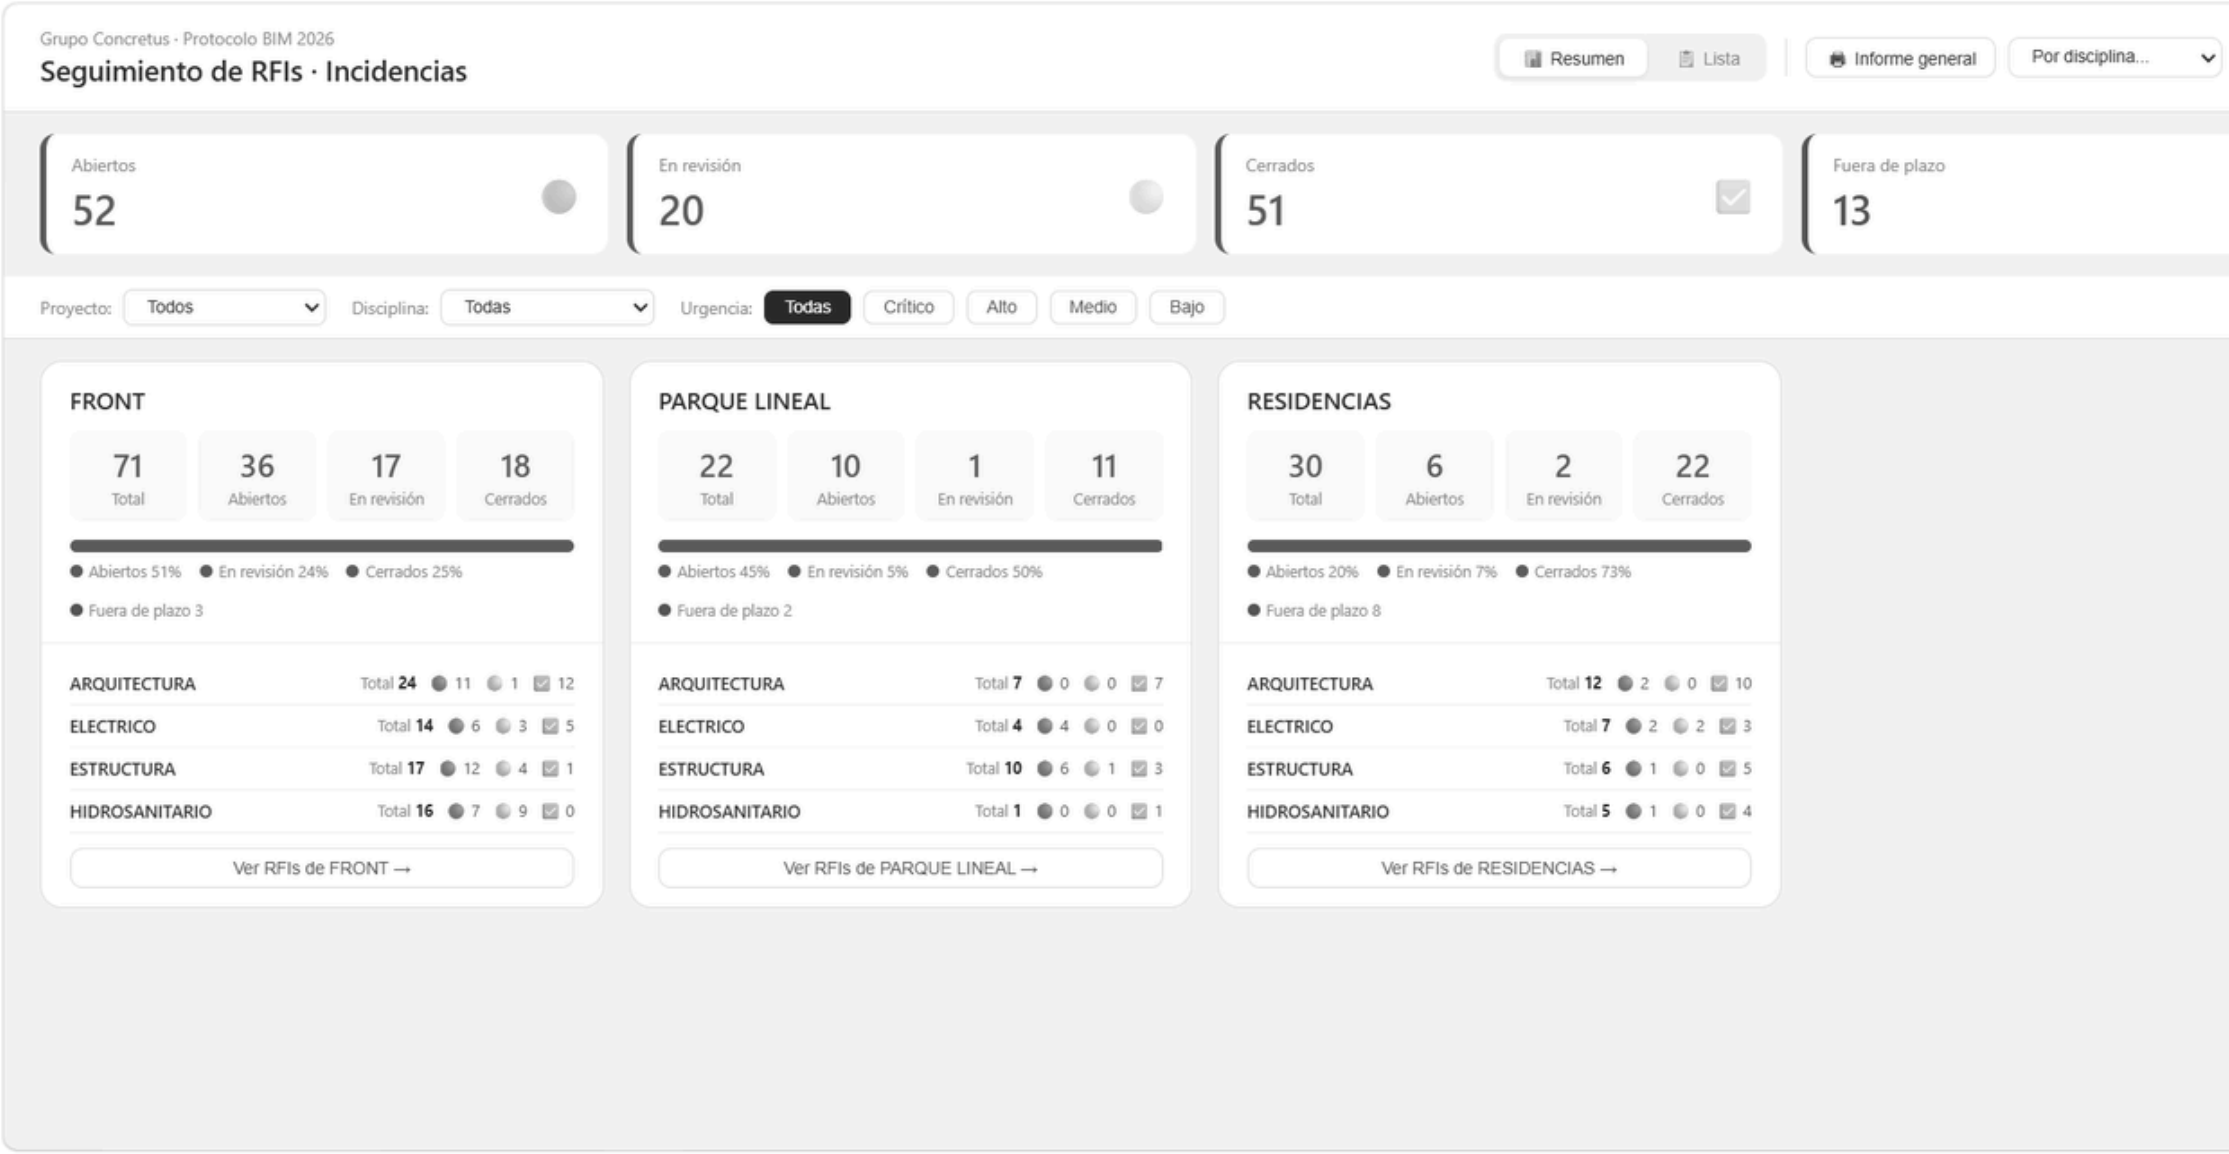

02

EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

BUSINESS INTELLIGENCE & WEB APPS (CONTROL ANEXOS)

03. MONITOREO DE AVANCE 5D

Automatización de planillas de avance físico-financiero vinculadas al parámetro GC_ITEM

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Tipo de anexo	Fecha de inicio	Proyecto	Disciplina	Total anexos	Anexos ejecutados	Anexos pendientes	Fecha límite	Fecha real de entrega	
EVALUACIÓN #3 (ANEXOS)	22/5/2026	FRONT	ARQUITECTURA	157	157	0		18/8/2026	
EVALUACIÓN #3 (ANEXOS)	22/5/2026	FRONT	ESTRUCTURA	80	80	0		18/8/2026	
EVALUACIÓN #3 (ANEXOS)	22/5/2026	FRONT	HIDROSANITARIO	72	72	0		18/8/2026	
EVALUACIÓN #3 (ANEXOS)	22/5/2026	FRONT	ELECTRICO	81	81	0		18/8/2026	
EVALUACIÓN #3 (ANEXOS)	22/5/2026	FRONT	AMBIENTALES	16	16	0		18/8/2026	
EVALUACIÓN #3 (ANEXOS)	22/5/2026	FRONT	MOV. TIERRA	3	3	0		18/8/2026	
PLANILLA #9	16/9/2026	RESIDENCIAS	ARQUITECTURA	14	14	0			
PLANILLA #9	16/9/2026	RESIDENCIAS	ESTRUCTURA	16	16	0			
PLANILLA #9	16/9/2026	RESIDENCIAS	HIDROSANITARIO	36	36	0			
PLANILLA #9	16/9/2026	RESIDENCIAS	ELECTRICO	21	21	0			
PLANILLA #9	16/9/2026	RESIDENCIAS	MOV. TIERRA	9	9	0		15/8/2026	
EVALUACION #3	24/9/2026	RESIDENCIAS	ARQUITECTURA	77	75	2			
EVALUACION #3	24/9/2026	RESIDENCIAS	ESTRUCTURA	33	33	0			
EVALUACION #3	24/9/2026	RESIDENCIAS	HIDROSANITARIO	121	121	0			
EVALUACION #3	24/9/2026	RESIDENCIAS	ELECTRICO	53	51	2			
EVALUACION #3	24/9/2026	RESIDENCIAS	MOV. TIERRA	10	10	0		15/8/2026	
EVALUACIÓN #3 (Ajustada)	21/5/2026	FRONT	ARQUITECTURA	14	14	0			
EVALUACIÓN #3 (Ajustada)	21/5/2026	FRONT	ESTRUCTURA	1	1	0			
EVALUACIÓN #3 (Ajustada)	21/5/2026	FRONT	HIDROSANITARIO	15	15	0			
EVALUACIÓN #3 (Ajustada)	21/5/2026	FRONT	ELECTRICO	18	18	0			
EVALUACIÓN #3 (Ajustada)	21/5/2026	FRONT	MOV. TIERRA	1	0	1			

EVALUACION #3

RESIDENCIAS

Total: 294 Ejecutados: 290 Pendientes: 4

99%

ESTRUCTURA 100%

Total: 33 Ejecutados: 33 Pendientes: 0

HIDROSANITARIO 100%

Total: 121 Ejecutados: 121 Pendientes: 0

MOV. TIERRA 100%

Total: 10 Ejecutados: 10 Pendientes: 0

ARQUITECTURA 97%

Total: 77 Ejecutados: 75 Pendientes: 2

ELECTRICO 96%

Total: 53 Ejecutados: 51 Pendientes: 2

PILAR-03

Alcance:

- Eficiencia Operativa
- Model Auditing & QA/QC
- Asistencia IA en Scripting

Herramientas:

- VS Code
- Revit API
- AI Code Assistants


Desarrollos destacados:

- Plugin Audit de Parámetros & Vistas
- Control de Salud del Modelo (QA/QC)
- Asistentes IA para Lógica BIM

AUTOMATIZACIÓN & IA

DESARROLLO DE PLUGINS & CONTROL DE CALIDAD BIM

Programación de algoritmos y plugins personalizados sobre la API de Autodesk Revit mediante VS Code e integración de asistentes IA. Enfoque orientado a la auditoría automatizada de modelos, verificación de nomenclatura de vistas y salud paramétrica de entregables.

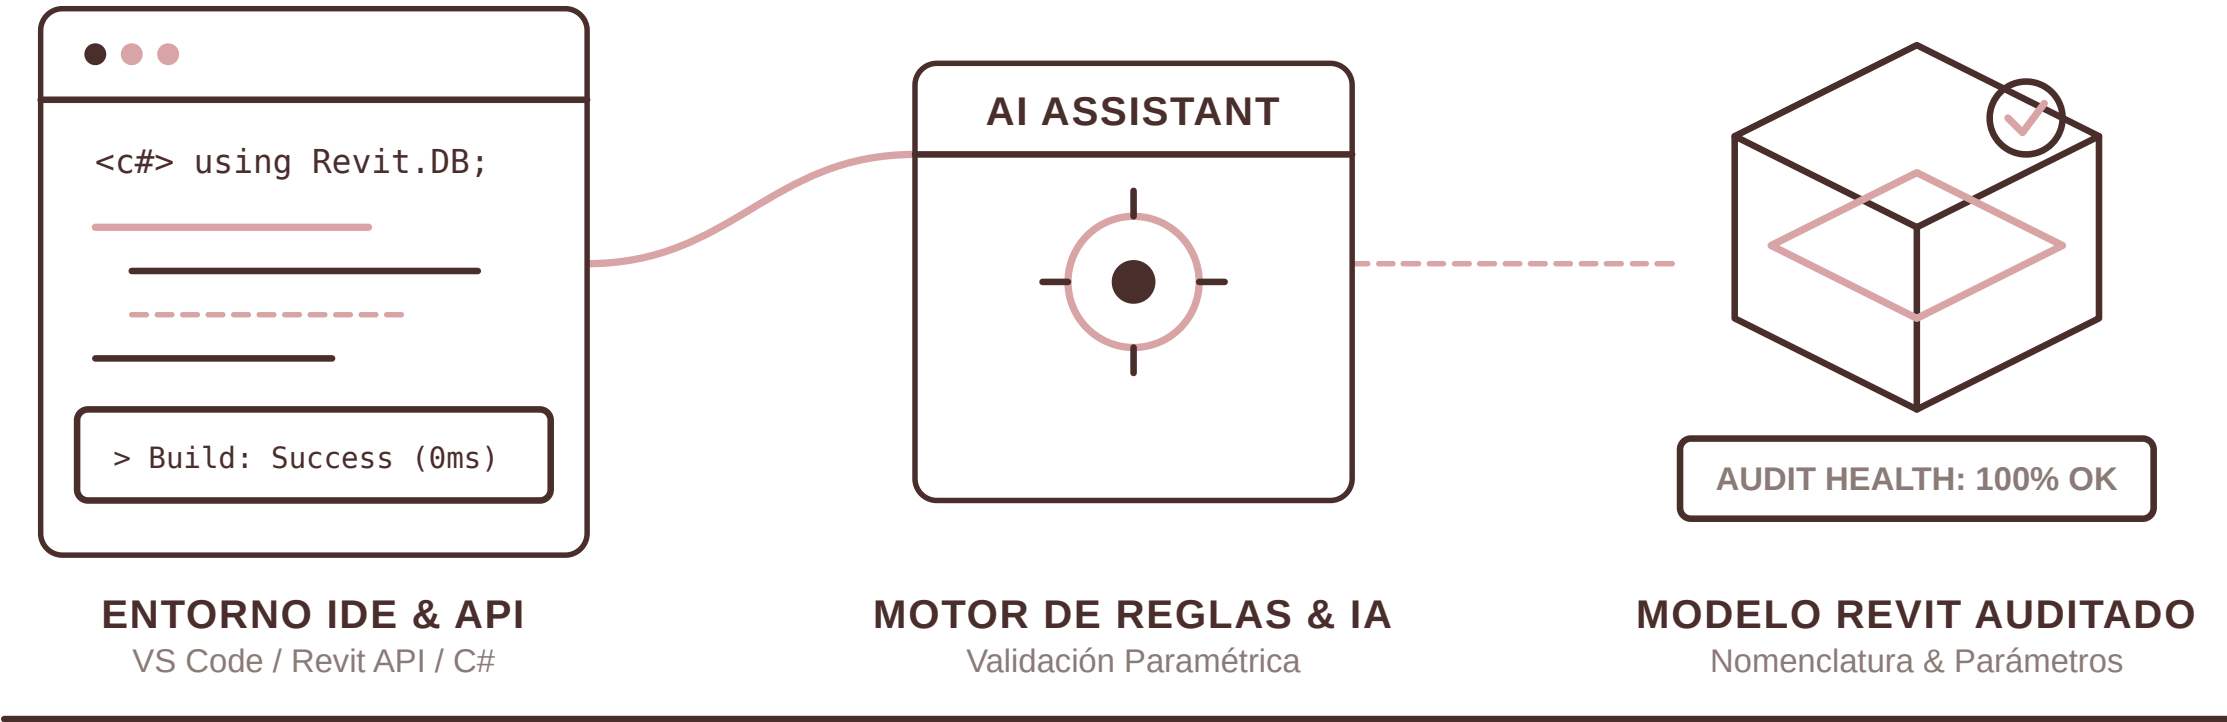

03


EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

AUTOMATIZACIÓN & PLUGIN PROPIO (REVIT API)

Desarrollo de C# & Revit API para Control de Calidad y Salud Paramétrica

01. ARQUITECTURA DE SOFTWARE C#


Estructura modular en VS Code / Visual Studio

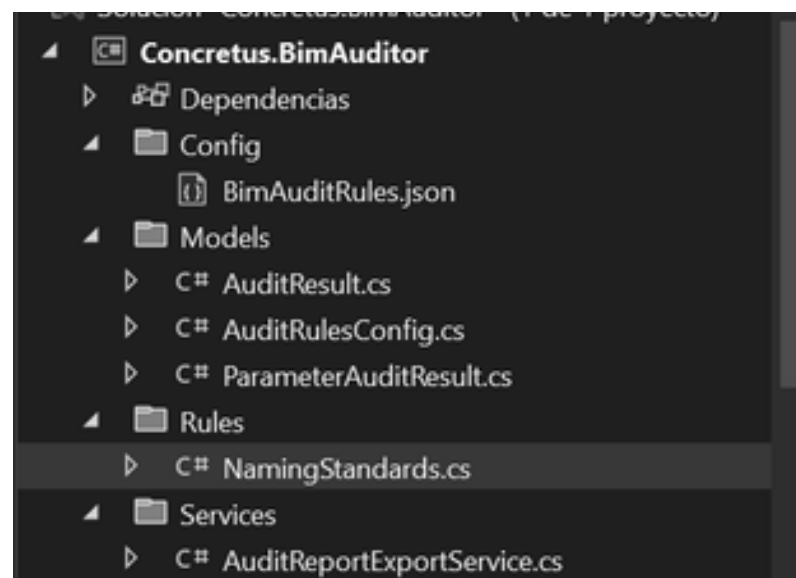

Desarrollo de la solución Concretus.BimAuditor bajo arquitectura en capas para auditoría de archivos, familias y parámetros.

02. LÓGICA DE AUDITORÍA & ESTÁNDARES


Evaluación automatizada de reglas BEP

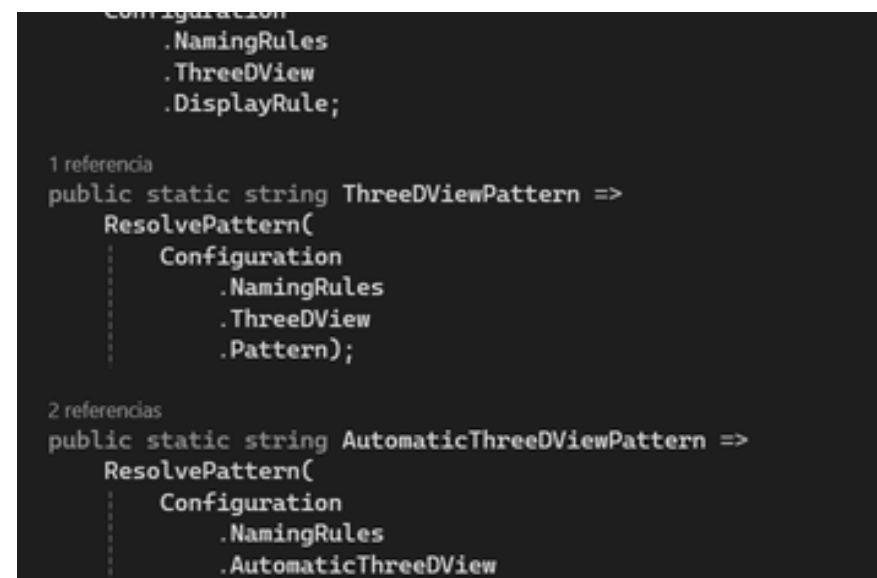

Algoritmos para verificación en tiempo real de nomenclaturas, vistas para exportación y organizadores del navegador, garantizando el cumplimiento estricto del protocolo BIM.

03. INTERFAZ DE USUARIO EN REVIT

Módulos de inspección

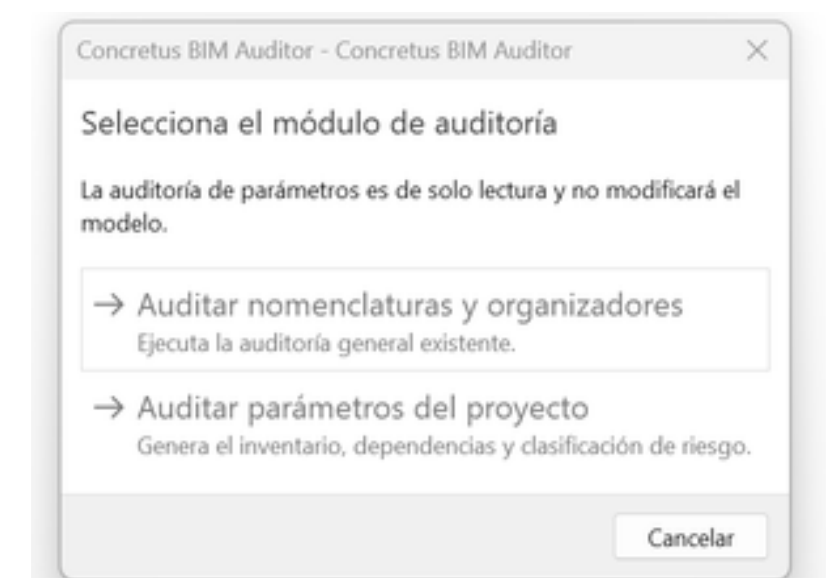

Despliegue de modal para auditoría: permite seleccionar módulos para evaluar organizadores del navegador o generar inventario y clasificación de riesgo de parámetros.

EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

Flujos de diagnóstico de nomenclatura, evaluación de riesgo paramétrico y purga asistida



Cálculo automático de salud del modelo

Algoritmo que audita en segundos cientos de vistas y planos, calculando porcentajes de cumplimiento global y desglosado por nomenclatura, navegador y láminas.

Concretus BIM Auditor - Concretus BIM Auditor

Auditoría inicial completada

CUMPLIMIENTO GLOBAL: 58,9%

Archivo principal: NO CUMPLE

NOMENCLATURA DE VISTAS

Evaluados: 128

Cumplen: 99

No cumplen: 29

No evaluables: 6

Cumplimiento: 77,3%

NAVEGADOR DE VISTAS

Evaluados: 132

Cumplen: 123

No cumplen: 9

Cumplimiento: 93,2%

NAVEGADOR DE PLANOS

Evaluados: 72

Cumplen: 59

No cumplen: 13

Cumplimiento: 81,9%

Generación de informes para gestión

Exportación automatizada de hallazgos a formato CSV para alimentar tableros de control en Power BI o Excel y dar seguimiento con los equipos de modelado.


D	E	F	G	H	I	J	K	L
NombreProy	NumeroProy	Abreviatura	Modelo	Disciplina	Proyecto	Cumplimiento	Categoria	TipoElemento
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		ARCHIVO	MODELO RV
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	ProjectBro
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	SystemBro
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Legend
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Legend
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	DraftingVi
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	Section
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan
ZONA CENTR	2	ZCEN	02-ZCEN-AR(	ARQ	"PROYECTO 147.2		VISTAS	FloorPlan

03

EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

MÓDULO DE PARÁMETROS & PURGA AUTOMÁTICA


Flujos de diagnóstico de nomenclatura, evaluación de riesgo paramétrico y purga asistida

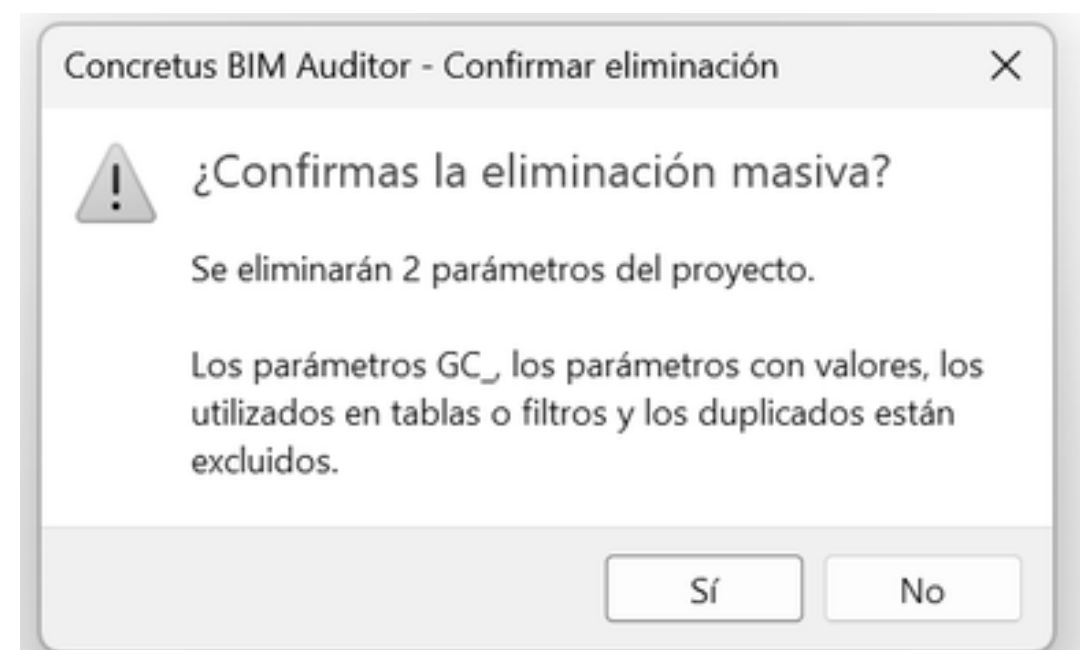

01. MATRIZ DE RIESGO PARAMÉTRICO

Detección de parámetros no autorizados o vacíos



Clasificación inteligente de parámetros según su nivel de riesgo (alto/bajo), identificando elementos huérfanos o sin valores para revisión del BIM Manager.

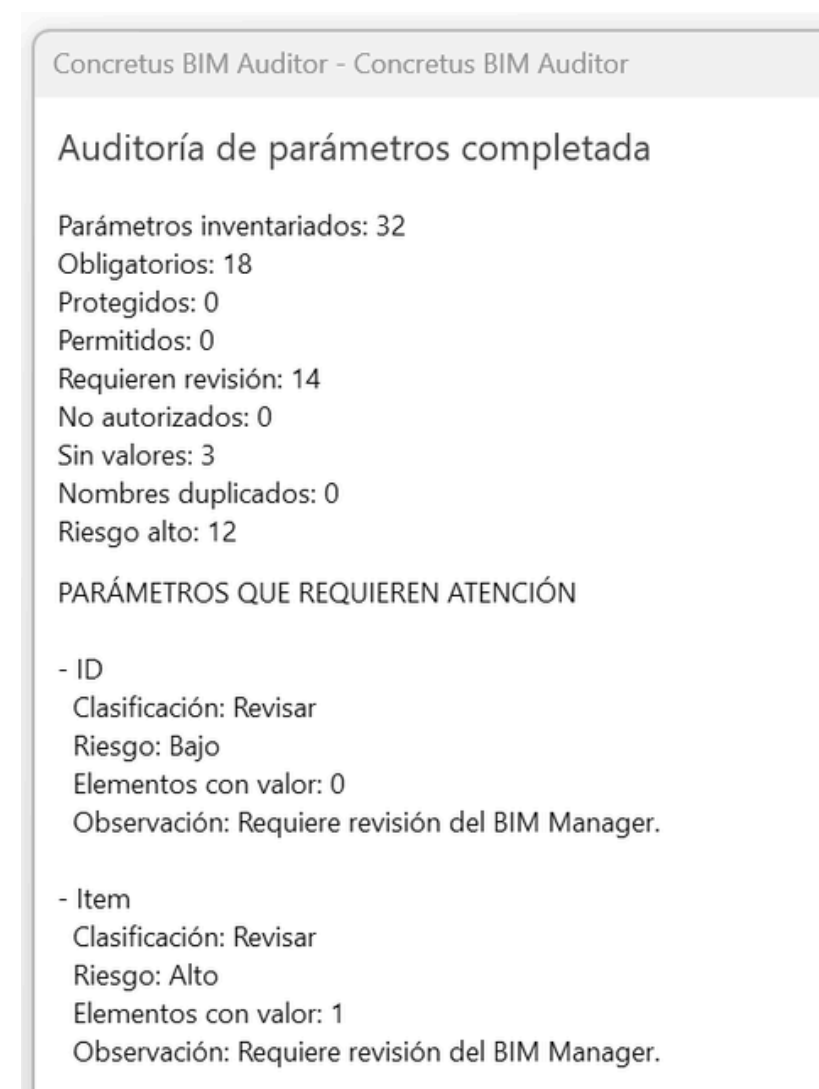

DEPURACIÓN INTELIGENTE Y LOG DE CAMBIOS

Eliminación asistida sin pérdida de información

Eliminación segura de parámetros basura no corporativos que no afectan familias ni tablas, generando un archivo de registro (CSV Log) con sello de tiempo para trazabilidad.

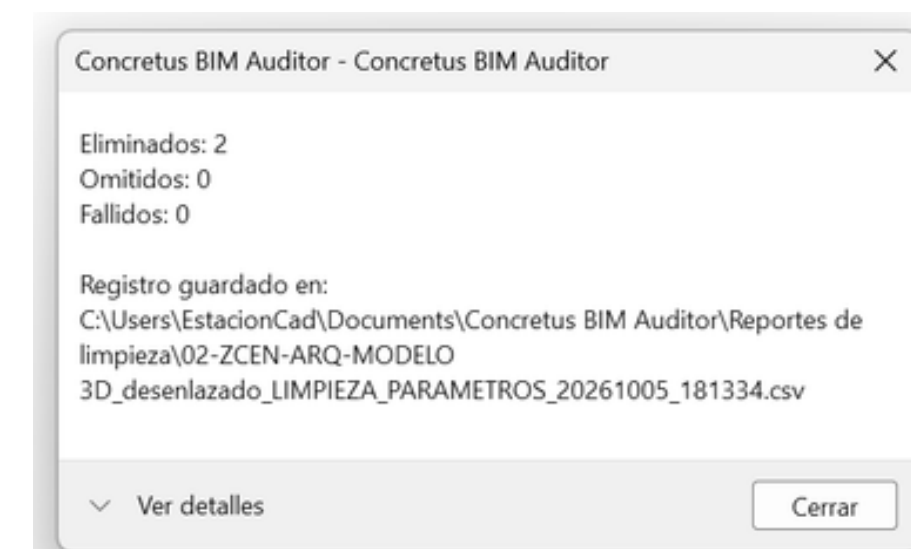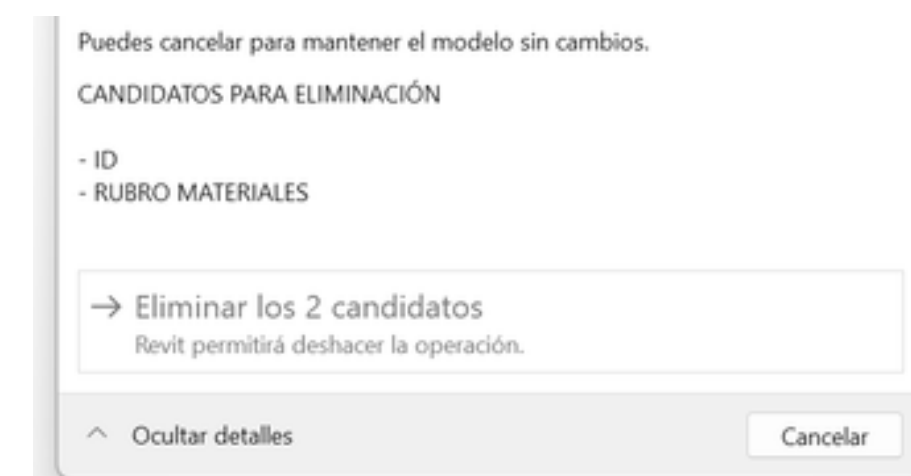

PILAR-04

GESTIÓN & COORDINACIÓN DIGITAL

ENTORNO COMÚN DE DATOS & REVIZTO

Administración de Entornos Comunes de Datos (CDE) en Autodesk Construction Cloud (ACC / Forma) y despliegue de Revizto para la gestión de incidencias en obra. Integración de flujos colaborativos campo-oficina y desarrollo de estrategias de comunicación visual para la adopción de protocolos BIM.

Desarrollos destacados:

- Estructura CDE Corporativa & Control de Accesos por Roles
- Trazabilidad de Hallazgos Obra-Modelo vía Revizto
- Campaña de Difusión Visual para Adopción del BEP



Alcance:

- Gobierno Documental & Flujos CDE
- Coordinación Digital & Control de Incidencias
- Adopción Digital & Cultura de Protocolos BIM

Herramientas:

- Autodesk Construction Cloud (ACC / Forma)
- Revizto

04 EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

ENTORNO COMÚN DE DATOS & REVIZTO EN OBRA

01. ESTRUCTURA Y PERMISOS EN ACC

Administración de CDE bajo ISO 19650

- Configuración del Entorno Común de Datos en Autodesk Construction Cloud (ACC) segregado en estados WIP, SHARED y PUBLISHED.
- Control de accesos y matriz de permisos por roles, garantizando seguridad documental y trazabilidad de versiones.

Permisos - 2.CONSTRUCCIÓN

+ Añadir

Exportar

Buscar nombre o correo elect.

Nombre	Permisos	Tipo
> Administrador	Administrar	-
Bim Leaders	Ver	Función Hered...
Coordinador de obra	Crear	Función Restablecer
Coordinador de pre...	Ver	Función Hered...
Coordinador Est. Té...	Ver	Función Hered...
Líder de disciplina	Ver	Función Hered...
Modelador	Ver	Función Hered...

Carpetas Conjuntos

Archivos de proyecto

1 CONSULTORÍA

2 CONSTRUCCIÓN

1 WIP

1 DOCUMENTACIÓN

2 PLANIFICACIÓN

3 EJECUCIÓN

4 AS-BUILT

5 EVALUACIÓN

6 PLANILLAS

2 SHARED

1 MODELOS 3D

2 PLANOS 2D

3 ANEXOS EVALUACIÓN

4 ANEXOS PLANILLAS

5 COORDINACIÓN BIM

3 PUBLISHED

1 DOCUMENTACIÓN

2 MODELOS 3D

3 PLANOS 2D

4 EVALUACIÓN

5 PLANILLAS

4 ARCHIVED

02. GESTIÓN DE INCIDENCIAS VÍA REVIZTO

Conexión directa entre Modelo 3D y Obra

- Centralización y seguimiento de hallazgos mediante el gestor de incidencias (Issue Tracker) de Revizto.
- Asignación de responsables, fechas de resolución y comunicación bidireccional entre oficina técnica y supervisión de campo.



Incidentes 32

Asignado a mí

Chat

abril 1, 2026

Luis Moreno 16:08

Grupo Con... • Control de... • Milagro

Marcado creado

Se modificó la persona asignada:

Añadió un observador:

16:09

Grupo Con... • Control de... • Milagro

Se modificó la prioridad: Menor → Mayor

16:11

Grupo Con... • Control de... • Milagro

La pergola esta ubicada donde existe un árbol existente

16:15

Grupo C... • Control d... • Oficina ...

Se modificó la persona asignada:

Añadió un observador:

Se modificó el estado: Abierto → En curso

abril 6, 2026

8:30

Grupo C... • Control d... • Oficina ...

Se modificó el estado: En curso → Resuelto

Comentario

04 EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

CULTURA BIM & MATERIAL DE DIFUSIÓN

01. ESTRATEGIA VISUAL PARA LA ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES

- Diseño de Infografías e Instructivos de Campo: Creación de material gráfico de alto impacto visual para capacitar al personal de obra en el reporte correcto de incidencias vía Revizto.
- Socialización de Estándares & Legibilidad: Difusión de manuales de nomenclatura, reglas de oro y buenas prácticas para homologar criterios de modelado y eliminar reprocesos.

FLUJO DE TRABAJO ACC

Ciclo semanal

Trabajo diario - Modeladores

WIP → Construcción → AS-BUILT → su especialidad

Trabajan colaborativamente en la nube y al final del día siempre deben quedar publicados los cambios.

Miércoles - Modelador - Líder de área

WIP → REVISIÓN 1 → SHARED

Modelador envía su modelo a revisión. Bim Leader aprueba

Jueves - Bim Leader - Bim Manager

SHARED → REVISIÓN 1 → REVISIÓN 2 → PUBLISHED

Bim Leader revisa. Bim manager revisa y aprueba.

Viernes - Publicación

PUBLISHED → REVIZTO

Modelos se actualizan

EL MODELO 'DE AUTOR' ROBA TIEMPO.

Usamos ese tiempo para adivinar.

Mejora la coordinación desde el inicio.

MEJORA LA COORDINACIÓN DESDE EL INICIO.

Coordinación BIM | Grupo Concrétus

REVIZTO EN OBRA: TU GUÍA RÁPIDA

Antes de ejecutar: **REVISA**. Si hay falla: **REPORTA**.


¿POR QUÉ USAR REVIZTO?




¿QUÉ PROBLEMAS REPORTAR?



¿CÓMO REPORTAR CORRECTAMENTE?



TIEMPOS DE REPORTE



Recuerda
SI NO ESTÁ REGISTRADO COMO ISSUE, EL PROBLEMA NO EXISTE.

Coordinación BIM | Grupo Concrétus

PERMISOS MÍNIMOS ACC (DOCs)																		
ROL	WIP					SHARED					PUBLISHED				ARCHIVED			
BIM MANAGER	V	C	U	E	P	V	C	U	E	P	V	U	P			V	U	
BIM LEADERS	V	C	U	E		V	C	U			V	C				V		
BIM MODELERS ("E" EN SU DISCIPLINA)	V	C	U	E		V	U				V					V		
ET (COORDINACIÓN TÉCNICA/LÍDERES DISCIPLINA)	V	C				V	C				V	C				V		
PRESUPUESTO ("E" EN SU DISCIPLINA)	V	C	U	E		V					V					V		
SUPERINTENDENTE DE OBRA											V	C				V		
RESIDENTES DE OBRA											V	C				V		
PLANILLADOR DE OBRA	V	C		E							V	C				V		



V Ver

C Comentar

U Subir

E Editar

P Publicar

¿QUÉ ES UN MODELO LEGIBLE?

MI MODELO DESORDENADO

NUESTRO DOCUMENTO LEGIBLE

Es un DOCUMENTO TÉCNICO.

Las decisiones deben entenderse sin que tú estés presente para explicarlas.

Coordinación BIM | Grupo Concrétus

ARCHIVO DE MODELO 3D

FORMATO
#Proyecto-ABREV-Disciplina-MODELO 3D

EJEMPLO
PROY-ABREV-ARQ-MODELO 3D.rvt

EJEMPLOS VÁLIDOS
• 08-REST-ARQ-MODELO 3D.rvt
• 12-GYM-EST-MODELO 3D.rvt

NOTAS
• El nombre del .rvt debe coincidir exactamente.
• Sin sufixos (v2_FINAL_copia). Control de versiones en ACC.

VISTAS DEL MODELO

TIPOS DE VISTA
DISC_Nivel_Descripcion Vista estándar
DISC_GEN_Descripcion Vista general (sin nivel)
EXP_DISC_Nivel_Descripcion Vista exportación
WRK_DISC_Nivel_Descripcion Vista trabajo interno

EJEMPLOS VÁLIDOS
• ARQ_NO2_TUMBADO GYPSUM
• H10_NOS_RED DE AGUA POTABLE
• ARQ_GEN_FACHADA NORTE
• EXP_ARQ_NO1_PLANTA ARQUITECT.
• WRK_EST_NO1_REVISION DE VIGAS

TABLAS GENERALES

FORMATO
TipoTabla_Descripcion

TIPOS
CANT Planificación / cantidades
CMAT Cómputo de materiales
ROOM Rooms y parámetros espaciales
COORD Coordinación con issues
PTLA Tabla gráfica de pilares
PLAN Lista de planos
VIST Lista de vistas

EJEMPLOS VÁLIDOS
• CANT_CLASIFICACION DE ACABADOS
• CMAT_CUANTIFICACION PIEZAS SANITARIAS
• ROOM_PROGRAMA DE ESPACIOS

FAMILIAS REVIT

FORMATO
Funcion_Material_Tipo

Función Nombre funcional del elemento. En MAYÚSCULAS, sin abreviar
Material Material principal del elemento. En MAYÚSCULAS
Tipo Variante específica. Puede combinar mayúsculas/ minúsculas

EJEMPLOS VÁLIDOS
• PUERTA_METALICA_Doble hoja
• LUMINARIA_LED_Pane1 60x60
• TUBERIA_PVC_60MM

NOTAS
• Toda familia nueva requiere aprobación del BIM Manager.
• Sin familias externas sin verificar geometría, categoría y parámetros.

RESUMEN EJECUTIVO

SÍNTESIS DE CAPACIDADES Y VALOR AGREGADO

Integración metodológica integral a lo largo del ciclo de vida del proyecto

PILAR 01

Gobernanza & Protocolo BIM

Diseño e implementación del marco metodológico corporativo. Estandarización de nomenclaturas, codificación de 12 disciplinas, parámetros de organización e investigación del flujo CDE.

PILAR 02

Business Intelligence & Web Apps

Creación de la plataforma BIM Hub v3.0 con Google Apps Script. Centralización de métricas de proyectos, trazabilidad de RFI's/incidencias y monitoreo de avance 5D en tiempo real.

PILAR 03

Automatización & IA (Revit API)

Desarrollo de plugins personalizados en C# (VS Code) asistidos por IA. Algoritmos para auditoría automatizada de salud del modelo, verificación de nomenclaturas y purga paramétrica inteligente.

PILAR 04

Gestión Digital & CDE en Obra

Gobernanza documental en Autodesk Construction Cloud (ACC bajo ISO 19650), gestión bidireccional de incidencias en obra con Revizto y campañas de difusión visual para adopción del BEP.

INGENIERÍA & GESTIÓN DIGITAL BIM

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y ATENCIÓN!

Disponible para liderar proyectos de implementación BIM, gestión de entornos comunes de datos (CDE) y coordinación digital multidisciplinaria en edificación e infraestructura.

CORREO ELECTRÓNICO



jamifi.me@gmail.com

TELÉFONO / WHATSAPP



+593 989147209

UBICACIÓN & DISPONIBILIDAD



Guayaquil, Ecuador · Proyectos Presenciales y Remotos

